专 项 工 作 汇 报

老旧小区改造工作汇报

汇报单位：市住房和城乡建设局

汇报时间：二〇二六年九月

（供市政府老旧小区改造工作评审组审议）

92.6%
年度完工率
63÷68 个小区

85.3%
资金到位率
3.65÷4.28 亿元

91.2%
居民总体满意率
有效样本 11,962 份

城镇老旧小区改造

汇报提纲

01	改造任务完成情况	完工率 92.6% ，惠及居民 3.86 万户
02	资金使用情况	到位率 85.3% ，支付率 78.6%
03	居民满意度	总体满意率 91.2% ，五个分项
04	存在问题	4 项，与前三部分数据逐项对应
05	下一步计划	4 项整改措施，逐条对应问题

一、改造任务完成情况

（一）总体完成情况

68 个
计划改造小区
326 栋 · 3.86 万户

63 个
已完工小区
占计划 92.6%

92.6%
年度完工率
63 个 ÷ 68 个

5 个
在建小区
2027 年 6 月底前完工

（二）分类改造内容完成进度



在建 5 个小区中，3 个因地下管线迁改协调周期较长滞后于序时进度（详见第四部分（一））。

注：完工率 = 已完工小区数 ÷ 计划改造小区数；分类进度按工程量测算；本页数据为情景示例，正式汇报以核定数为准。

二、资金使用情况

（一）资金总体情况


资金实行专账核算、专款专用，审计核查未发现挤占挪用情形

4.28 亿元
计划总投资
五类渠道合计投入

85.3%
资金到位率
累计到位 3.65 亿元

78.6%
资金支付率
累计支付 2.87 亿元

（二）资金构成与到位进度

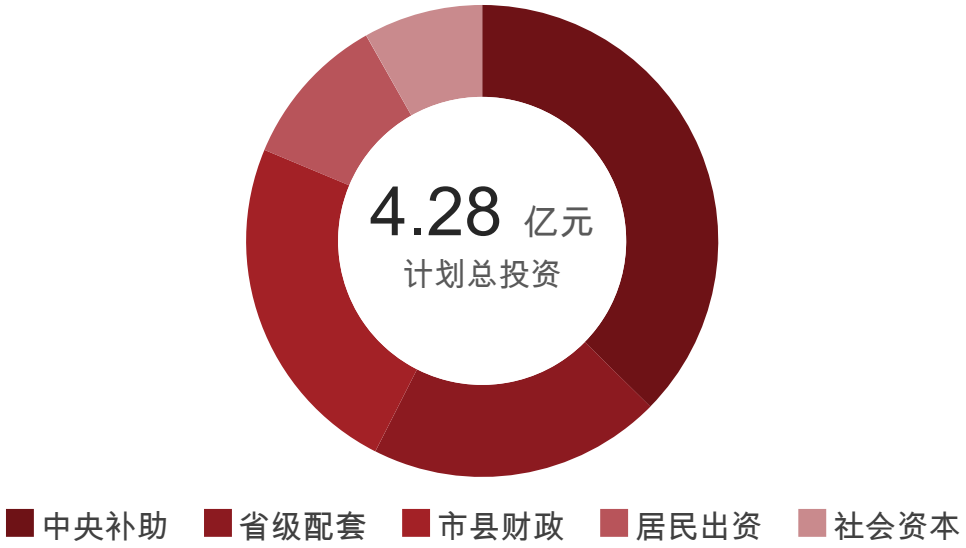

单位：亿元

资金渠道	计划投资	占比	累计到位	到位率
中央补助资金	1.60	37.4%	1.60	100.0%
省级配套资金	0.86	20.1%	0.86	100.0%
市县财政资金	1.02	23.8%	0.70	68.6%
居民出资	0.45	10.5%	0.30	66.7%
社会资本	0.35	8.2%	0.19	54.3%
合计	**4.28**	**100.0%**	**3.65**	**85.3%**

注：到位率 = 累计到位资金 ÷ 计划总投资；支付率 = 累计支付资金 ÷ 累计到位资金；本页数据为情景示例，正式汇报以核定数为准。

三、居民满意度

（一）调查基本情况


12,480 份
发放问卷
覆盖 68 个改造小区

95.8%
问卷有效回收率
回收有效问卷 11,962 份

91.2%
居民总体满意率
含“满意”与“基本满意”

调查方式：入户问卷与现场访谈相结合，调查覆盖全部 68 个改造小区。

（二）分项满意率

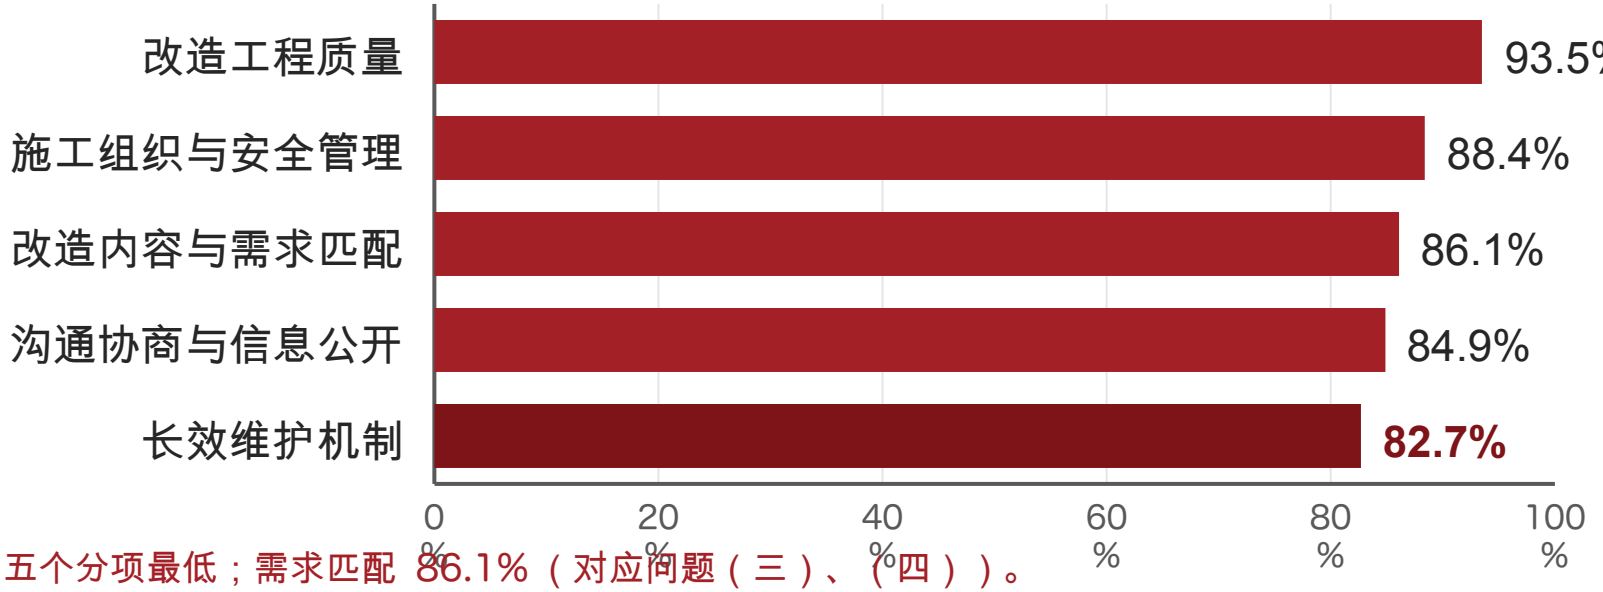

短板项：长效维护机制 82.7% 为五个分项最低；需求匹配 86.1%（对应问题（三）、（四））。

注：满意率 = 评价为“满意”或“基本满意”的样本数 ÷ 有效样本数；本页数据为情景示例，正式汇报以核定数为准。

四、存在问题

对照前三部分任务完成、资金到位与满意度调查数据，主要存在以下四方面问题：

01 个别在建项目收尾滞后

年度完工率 92.6% ，尚有 5 个小区在建；

其中 3 个因地下管线迁改协调周期较长，工程进度滞后于序时进度；提升类完成进度 78.5% ，低于基础类与完善类。

〔对应第一部分：完工率 92.6% 、在建 5 个〕

02 配套资金到位不均衡

资金总体到位率 85.3% 、支付率 78.6% ，分渠道到位不均衡。市县财政资金到位率 68.6% 、社会资本到位率 54.3% ，明显低于中央与省级资金 100.0% 的到位水平。

〔对应第二部分：到位率 68.6% / 54.3% 、支付率 78.6%〕

03 长效维护机制尚不健全

已完工小区管养责任划分不够明晰，专业化物业服务覆盖不足，设施维护经费保障尚未制度化落实。长效维护机制满意率 82.7% ，为五个分项中最低，低于总体 91.2% 。

〔对应第三部分：长效维护机制满意率 82.7%〕

04 居民需求征集不够充分

部分小区方案征询覆盖面不足，意见征集渠道单一，方案公示与施工信息公开不够及时、内容不够完整。需求匹配满意率 86.1% ，低于工程质量分项 93.5% 。

〔对应第三部分：需求匹配满意率 86.1%〕

注：本页各项问题所引数据与前三部分汇报口径一致；整改安排详见第五部分。

五、下一步计划

总体要求：坚持问题导向、目标导向，逐项对照整改，2027 年 6 月底前全面收官。

01 攻坚收尾在建项目

对 5 个在建小区实行“一小区一专班”，逐周调度、挂图作战，2027 年 6 月底前全部完工并完成竣工验收，年度完工率达到 100.0%。

〔对应问题（一）｜责任：市住建局改造办、属地街道〕

02 加快配套资金拨付到位

压实市县配套与社会资本出资责任，实行分渠道月度通报；2026 年 12 月底前各渠道到位率达到 100.0%，累计支付率提升至 90.0% 以上，同步加快竣工结算。

〔对应问题（二）｜责任：市财政局、市住建局〕

03 健全长效维护机制

对已完工小区逐个明确管养责任，2027 年 3 月底前 68 个小区全部建立街道、社区、居民三方共管机制，长效维护机制满意率提升至 90.0%。

〔对应问题（三）｜责任：属地街道、市住建局〕

04 完善居民参与机制

改造方案征询实现全覆盖，推行改造前后两次公示与意见反馈闭环办理，未采纳意见逐一说明理由，需求匹配满意率提升至 90.0%。

〔对应问题（四）｜责任：市住建局改造办〕

注：完工率、到位率、支付率、满意率目标值均按前述统一口径测算，节点为 2027 年 6 月底前。

城镇老旧小区改造

以上汇报完毕，请评审组审阅。

市住房和城乡建设局

二〇二六年九月

恳请评审组对汇报内容提出指导意见。
