老旧小区改造工作情况汇报

2023—2025 · 2026 8 31

92.6%

90.0%

93.8%

Scenario data ·

汇报纲目与统一口径

汇报说明

2023 1 – 2026 8

2026 8 31

÷
× 100%

≥95%
90% – 95%
90%

一、改造任务完成情况 P03—P04
÷ ×100% 92.6% 63 68

二、资金使用情况 P05—P06
÷ ÷ 90.0% 86.0%

三、居民满意度 P07—P09
÷ ×100% 93.8% 85.7%

四、存在问题 P10—P11

五、下一步计划 P12—P13
“ → ”

□□□□□□□□□□

68　　100.0%　　63　　92.6%　　“　　”

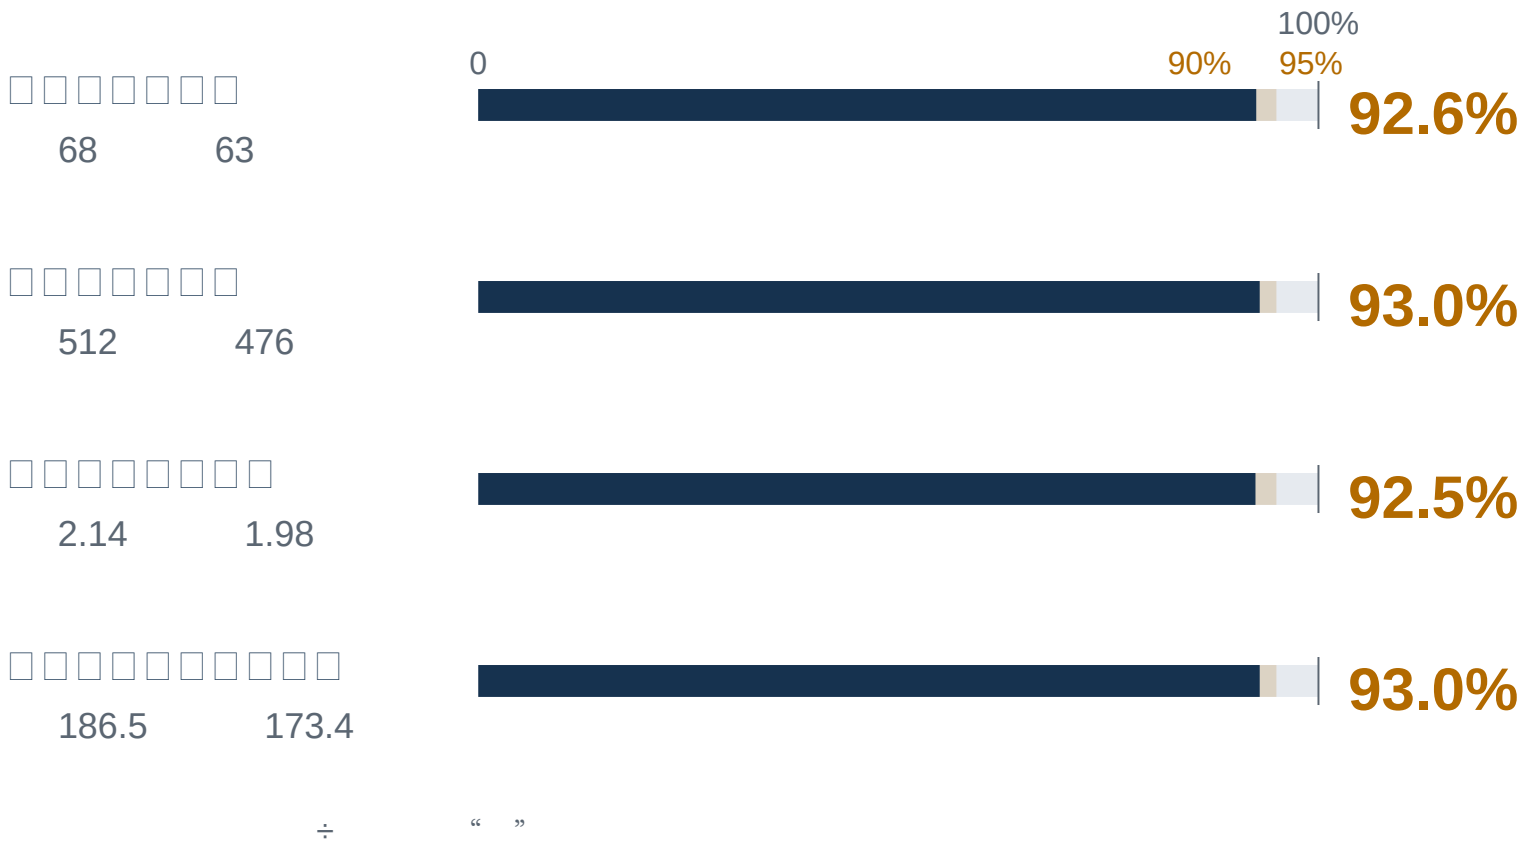

÷　　“　”

□□□□□

2023—2025　　2000

68 □　　**512** □

2.14 □□　　**186.5** □□□□

□□□□

5　　36　　1600

13.1　　7.4%

□□□□

90%—95%

分项改造任务完成明细

90.0%　　4　　90.0%

基础设施类			68	63	92.6%	基本达标
	5G		68	66	97.1%	达标
			120	96	80.0%	滞后
完善类			3200	2860	89.4%	滞后
			260	241	92.7%	基本达标
			180	163	90.6%	基本达标
			24	19	79.2%	滞后
提升类			68	61	89.7%	滞后
			15.6	14.1	90.4%	基本达标
	1　　4　　4					

P02　　≥ 95%　　90%　– 95%　　90%

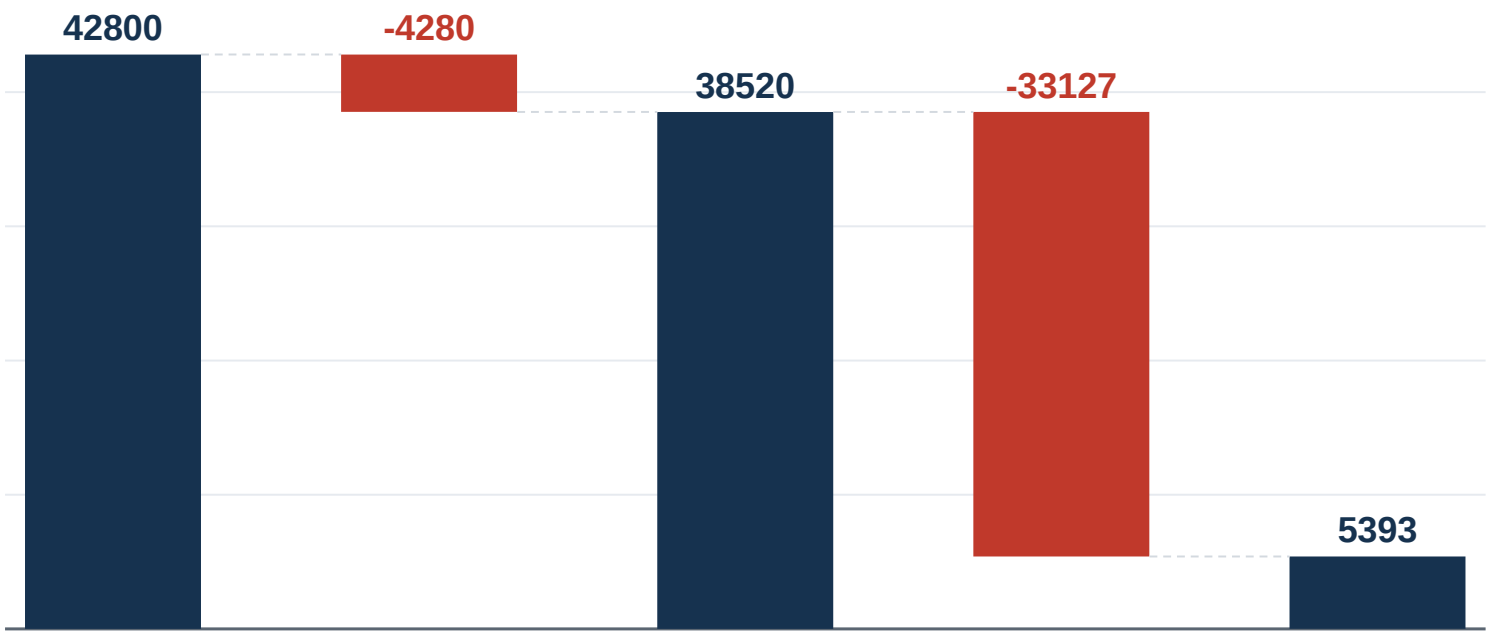

资金到位与支出执行总体情况

38520 90.0% 33127 86.0% 5393

关键指标

42800 万元

38520 万元

90.0% 4280

33127 万元

86.0%

5393 万元

14.0%

1.9

÷

÷ ×100% 90.0% ÷ ×100% 86.0%

÷ ×100% 14.0%

资金来源与支出构成明细

100.0% 81.8% 73.0% 65.8% 4280

资金来源		7704	7704	100.0%	0
		4622	4622	100.0%	0
		11556	11556	100.0%	0
		11770	9630	81.8%	2140
		4222	3082	73.0%	1140
		2926	1926	65.8%	1000
	来源小计	**42800**	**38520**	**90.0%**	**4280**
资金支出		18490	16564	89.6%	1926
		11556	9938	86.0%	1618
		6548	4969	75.9%	1579
		1926	1656	86.0%	270
	支出小计	**38520**	**33127**	**86.0%**	**5393**

资金监管情况

68
100.0%

41
65.1%

68 100.0%

3236
60.0%

“ ”

38520 P02 ≥ 95% 90% — 95% 90%

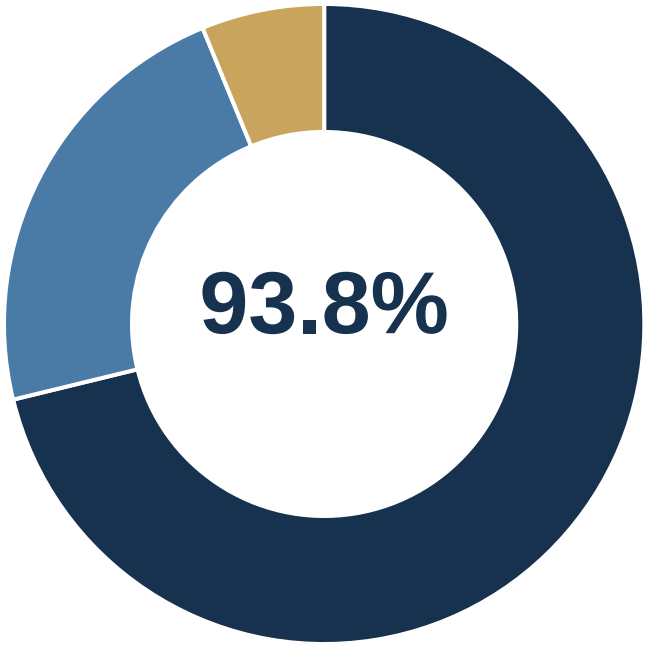

居民总体满意度及构成

6214 91.4% 93.8% 6.2% 385

满意	4424	71.2%
基本满意	1405	22.6%
不满意	385	6.2%

调查执行情况

6800
6532
6214
91.4%

2026 7 1 8 15

318

÷ ×100%

÷ ×100%

68 100
P08

□□□□□□□□□

96.4%　95.1%　84.6%　82.1%　79.4%

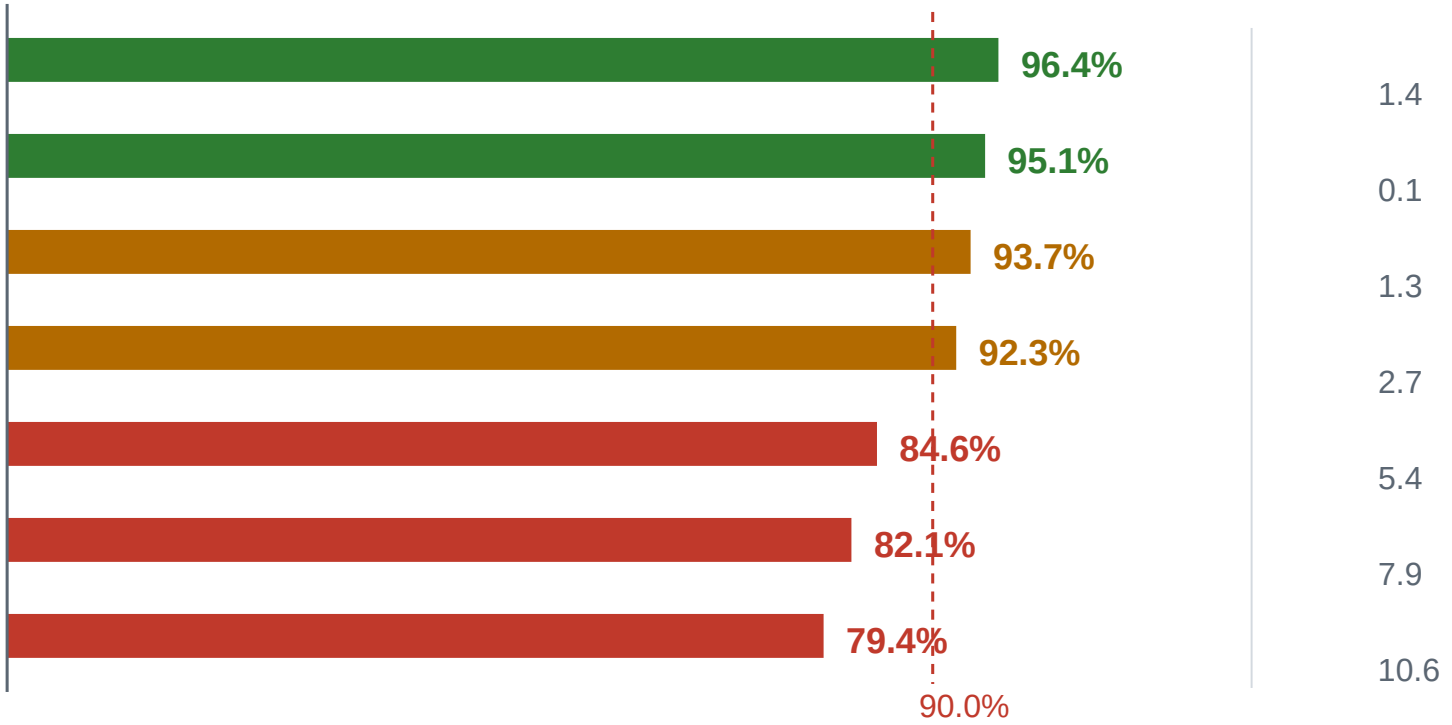

÷　6214　×100%　P07　95.0%　90.0%

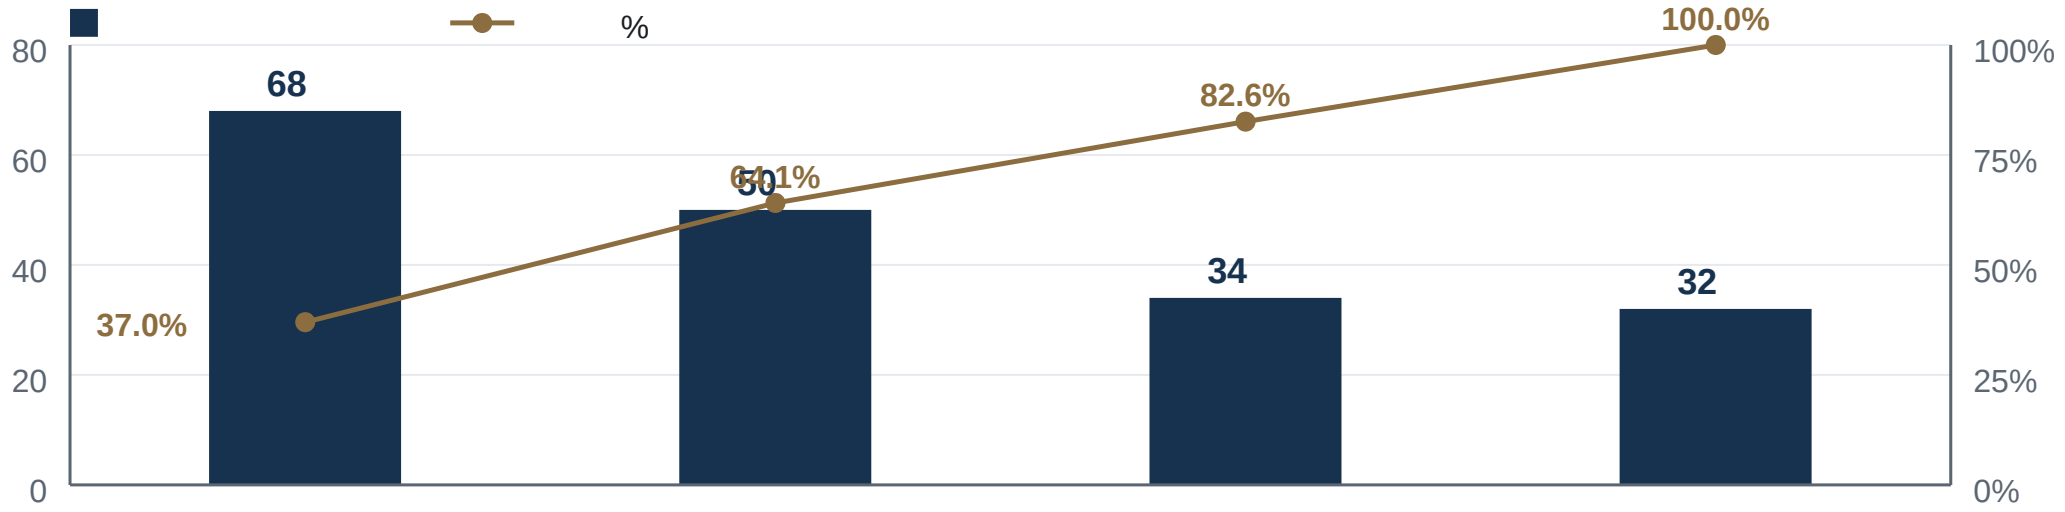

居民诉求办理及未办结诉求分布

184	68	50	64.1%

1286 件	**1102** 件	**85.7%**	**184** 件	÷ ×100%

	118	64.1%	P08	84.6%	
82.1%		P04	80.0%	89.4%	

存在问题（一）：资金筹措与支出进度

P05　P06　　90.0%　　86.0%

[redacted] 资金筹措渠道未闭合，**4280** 万元缺口集中于三类渠道

数据溯源	P06	81.8%	2140	P06	73.0%	1140	P06	65.8%	1000

90.0%　　5　　24

100.0%

[redacted] 支出进度滞后于资金到位，**5393** 万元结余未形成实物工作量

数据溯源	P05	86.0%	90.0%	P06	75.9%	1579

38520　　33127　　5393　　75.9%

3236　　79.2%　　P04

存在问题（二）：任务推进与居民诉求

P04 P08 P09

提升类与完善类任务推进不均衡

数据溯源 P04 80.0% 89.4% P04 79.2% 89.7% P08 84.6% 82.1%

主要表现 影响

施工期现场管理不到位，影响居民满意度

数据溯源 P08 79.4% P09 32

主要表现 影响

93.8%

改造与后续管养衔接不畅

数据溯源 P09 34 85.7% P04 79.2%

主要表现 影响

19

整改措施与责任分工

P02

01	问题一	2140		2026 10	区级到位率 **100.0%**
02	问题一	“ ”		2026 11	社会资本到位率 **95.0%**
03	问题一			2026 12	居民出资到位率 **90.0%**
04	问题二	3236		2026 11	支出执行率 **95.0%**
05	问题三			2026 11	完成率均达 **90.0%**
06	问题四	24		2026 10	施工管理满意度 **90.0%**
07	问题五			2026 12	设施移交率 **100.0%**

5 P02

95.0% 90.0% P02 P08

长效机制与请示事项

建立长效机制

1 资金保障长效化

2 支出进度闭环管理

30

3 居民全程参与机制

90.0%

4 改造与管养衔接

以上汇报，请予审议。

请示事项

一 追加区级配套资金

2140

10

二 顺延在建项目工期

5

2026 11

三 支持管线单位共建共担

“ ”

2026 8 31 · ·
