专项工作汇报 | 提请政府评审组审议

老旧小区改造工作情况汇报

2023—2025 年改造任务实施情况 · 数据截至 2026 年 8 月 31 日

小区完工率

92.6%

口径：竣工验收小区数 ÷ 计划改造小区数

资金到位率

90.0%

口径：实际到位资金 ÷ 计划总投资

居民满意度

93.8%

口径：（满意 + 基本满意）÷ 有效问卷

汇报纲目：一、改造任务完成情况　二、资金使用情况　三、居民满意度　四、存在问题　五、下一步计划

区住房和城乡建设局　区老旧小区改造工作领导小组办公室

二〇二六年九月

情景数据（Scenario data）· 比率均保留一位小数

汇报纲目与统一口径

五项纲目依次汇报，全篇共用一套统计口径与一套判定阈值，各页数据可逐格核对。

汇报说明

数据期间

2023 年 1 月—2026 年 8 月

数据截至

2026 年 8 月 31 日

统计口径（全篇一致）

各项比率 = 完成（到位、支出、满意）数 ÷ 计划（到位）数 × 100%

判定阈值（全篇一致）

≥95%　达标

90%（含）—95%　基本达标

90%　滞后／短板

一、改造任务完成情况

口径：完成率 = 完成数 ÷ 计划数 ×100%　|　小区完工率 92.6%（63 ／ 68 个）　P03—P04

二、资金使用情况

口径：到位率 = 到位数 ÷ 计划总投资；支出执行率 = 已支出 ÷ 已到位　|　90.0%、86.0%　P05—P06

三、居民满意度

口径：满意度 =（满意 + 基本满意）÷ 有效问卷 ×100%　|　93.8%、诉求办结率 85.7%　P07—P09

四、存在问题

口径：每项问题标注数据出处页与具体比率　|　五个问题，全部回溯至第二、第三部分　P10—P11

五、下一步计划

口径：目标值以“现状 → 目标”表述　|　七项措施、三项提请审议事项　P12—P13

改造任务总体完成情况

累计开工 68 个小区、开工率 100.0%；完工 63 个、完工率 92.6%，按统一判定阈值属“基本达标”。



改造小区（个）
计划 68 | 已竣工 63
92.6%
基本达标

改造楼栋（栋）
计划 512 | 已完成 476
93.0%
基本达标

惠及居民（万户）
计划 2.14 | 已完成 1.98
92.5%
基本达标

建筑面积（万平方米）
计划 186.5 | 已完成 173.4
93.0%
基本达标

口径说明：完工率 = 已通过竣工验收小区数 ÷ 计划改造小区数；“在建”指已开工未竣工。

计划总盘子

2023—2025 年，2000 年底前建成

改造小区	涉及楼栋
68 个	512 栋

涉及居民	建筑面积
2.14 万户	186.5 万平方米

在建情况

在建 5 个小区、36 栋、1600 户、
13.1 万平方米，占计划 7.4%

总体判定

四项总量完成率均落在 90%—95%
区间，按统一阈值判定为基本达标

数据来源：改造工作台账、竣工验收备案表

数据截至 2026 年 8 月 31 日 · 比率保留一位小数 · 情景数据

分项改造任务完成明细

基础设施类完成率均高于 90.0%，完善类与提升类有 4 项低于 90.0%，是总体完工率未达标的主因。

类别	改造内容	单位	计划量	完成量	完成率	进度状态
基础设施类	水电气路及雨污分流	个小区	68	63	92.6%	基本达标
	光纤及 5G 覆盖	个小区	68	66	97.1%	达标
完善类	加装电梯	部	120	96	80.0%	滞后
	新增停车泊位	个	3200	2860	89.4%	滞后
	电动自行车充电设施	处	260	241	92.7%	基本达标
	无障碍及适老化改造	处	180	163	90.6%	基本达标
	社区服务及养老托幼设施	处	24	19	79.2%	滞后
提升类	智慧安防（视频监控、门禁）	个小区	68	61	89.7%	滞后
	绿化及公共空间	万平方米	15.6	14.1	90.4%	基本达标
	九项分项任务：达标 1 项、基本达标 4 项、滞后 4 项（滞后项集中在完善类与提升类）					


判定阈值（与 P02 一致）：完成率≥ 95% 为达标，90%（含）— 95% 为基本达标，< 90% 为滞后。 ■ 达标 ■ 基本达标 ■ 滞后

数据来源：改造工作台账、分项工程竣工验收备案表

数据截至 2026 年 8 月 31 日 · 比率保留一位小数 · 情景数据

资金到位与支出执行总体情况

资金到位 38520 万元、到位率 90.0%，已支出 33127 万元、执行率 86.0%，账面积余 5393 万元。

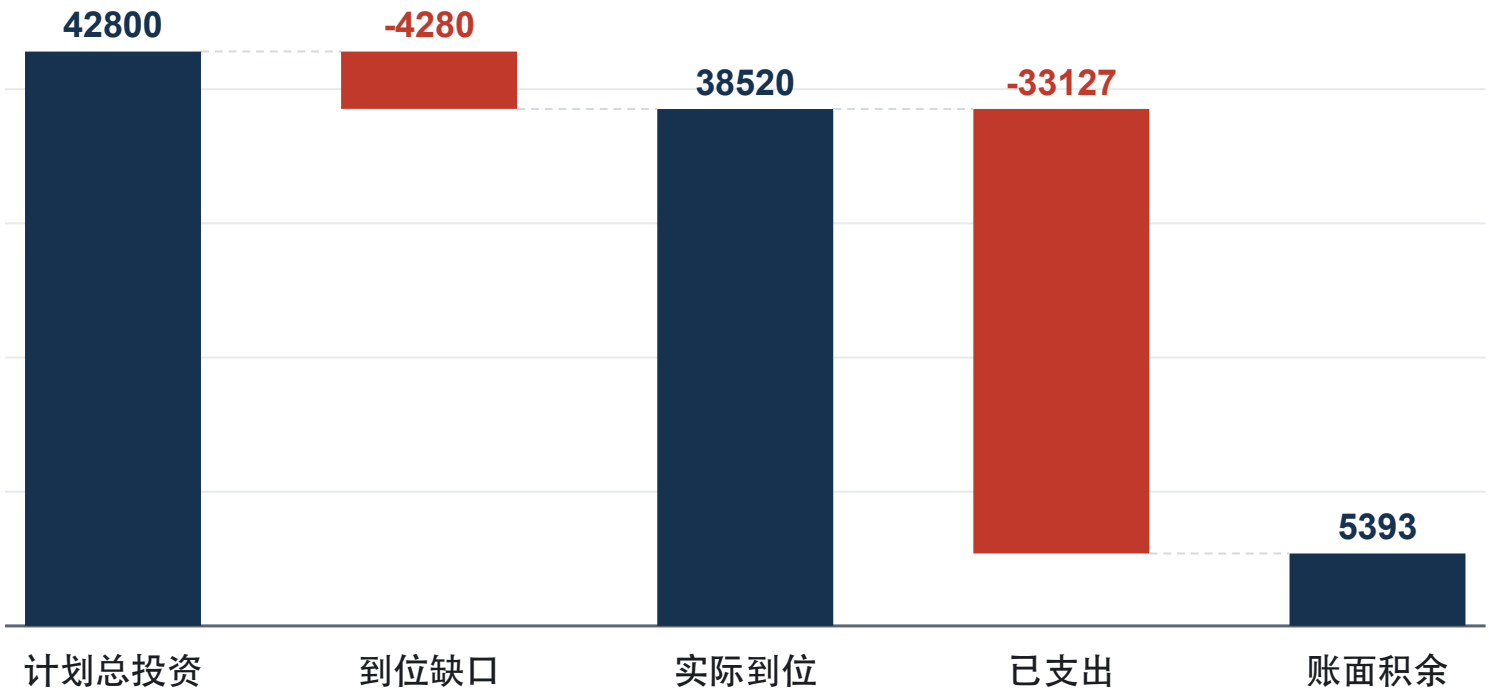

关键指标

计划总投资 **42800 万元**
含四级财政及社会、居民出资

实际到位资金 **38520 万元**
到位率 90.0%，缺口 4280 万元

已支出资金 **33127 万元**
支出执行率 86.0%

账面积余资金 **5393 万元**
结余率 14.0%

户均投入 1.9 万元
按已到位资金 ÷ 已完成户数计算

比率口径（全篇一致）：资金到位率 = 实际到位 ÷ 计划总投资 ×100% = 90.0%；支出执行率 = 已支出 ÷ 实际到位 ×100% = 86.0%；结余率 = 账面积余 ÷ 实际到位 ×100% = 14.0%。金额单位为万元，比率保留一位小数。

数据来源：专项资金决算表、财政拨付台账

数据截至 2026 年 8 月 31 日 · 比率保留一位小数 · 情景数据

资金来源与支出构成明细

三级财政资金 100.0% 到位；区级配套 81.8%、社会资本 73.0%、居民出资 65.8%，缺口 4280 万元。

资金来源与支出执行情况（单位：万元）

类别	项目	计划数	执行数	执行率	差额
资金来源	中央补助资金	7704	7704	100.0%	0
	省级补助资金	4622	4622	100.0%	0
	市级财政资金	11556	11556	100.0%	0
	区级财政配套	11770	9630	81.8%	2140
	管线单位及社会资本	4222	3082	73.0%	1140
	居民出资	2926	1926	65.8%	1000
	来源小计	**42800**	**38520**	**90.0%**	**4280**
资金支出	基础设施类	18490	16564	89.6%	1926
	完善类（含加装电梯）	11556	9938	86.0%	1618
	提升类	6548	4969	75.9%	1579
	前期及管理费	1926	1656	86.0%	270
	支出小计	**38520**	**33127**	**86.0%**	**5393**

资金监管情况

专户核算、专款专用

68 个小区全部纳入专户，覆盖率 100.0%

全过程跟踪审计

已审计 41 个项目，占已竣工项目的 65.1%

按小区公示资金使用情况

公示 68 个小区，公示率 100.0%

结余资金构成

3236 万元因结算审计未完成暂不能拨付，占结余 60.0%


表内口径：来源组“执行数／执行率”为实际到位数／到位率（分母为计划数）；支出组为已支出数／支出执行率（分母为该类资金安排数，安排数合计 = 已到位资金 38520 万元）；判定阈值与 P02 一致：≥ 95% 达标、90%（含）— 95% 基本达标、< 90% 滞后。

数据来源：专项资金决算表、财政拨付台账、审计意见书

数据截至 2026 年 8 月 31 日 · 比率保留一位小数 · 情景数据

居民总体满意度及构成

有效问卷 6214 份、有效回收率 91.4%，总体满意度 93.8%，不满意占 6.2%（385 人）。

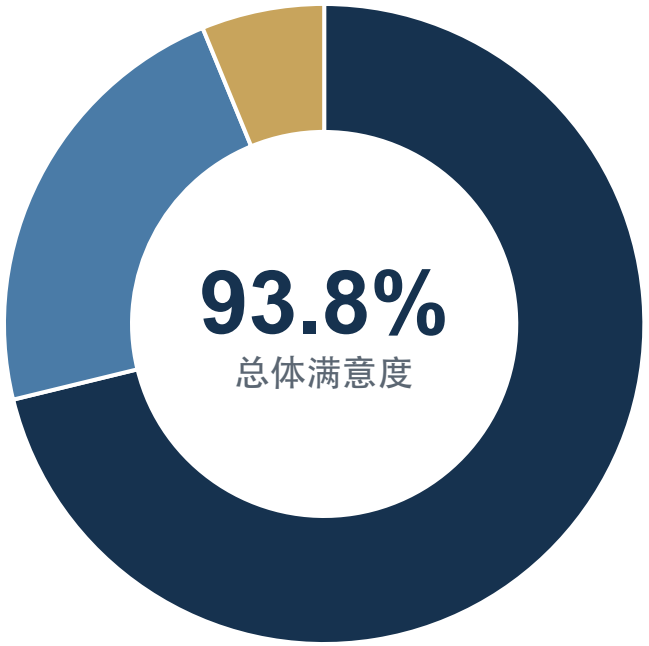

满意	4424 人	71.2%
基本满意	1405 人	22.6%
不满意	385 人	6.2%

调查方式：入户走访 + 线上问卷，覆盖 68 个改造小区，每小区随机抽取 100 户。
总体满意度为对改造工作的整体评价，与 P08 各分项满意度分属不同题项，不作相互替代。

调查执行情况

发放问卷	6800 份
回收问卷	6532 份
有效问卷	6214 份
有效回收率	91.4%


调查时间
2026 年 7 月 1 日至 8 月 15 日

无效问卷
318 份，均为填答不完整

满意度计算口径
总体满意度 =（满意 + 基本满意）÷ 有效问卷 ×100%
各分项满意度 = 该分项满意与基本满意人数 ÷ 有效问卷 ×100%

七个分项满意度对比

基础设施 96.4%、环境绿化 95.1% 达标；加装电梯 84.6%、停车泊位 82.1%、施工管理 79.4% 滞后。

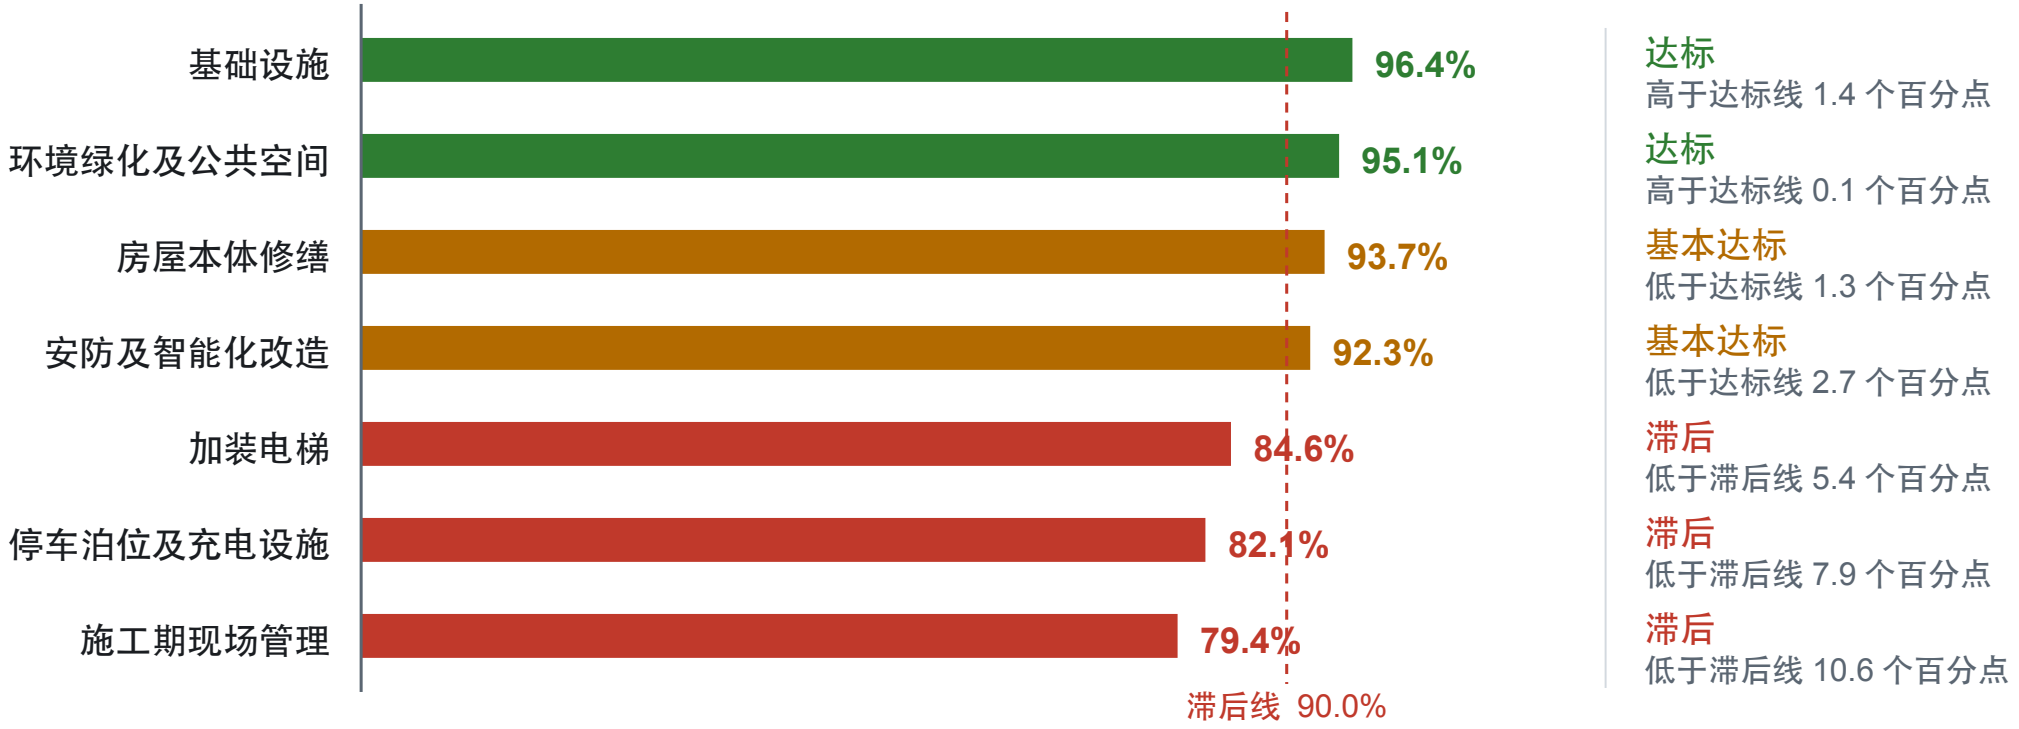

分项满意度口径：该分项（满意 + 基本满意）人数 ÷ 有效问卷 6214 份 ×100%，与 P07 总体满意度同一口径；达标线 95.0%、滞后线 90.0%。

数据来源：第三方机构居民满意度入户调查问卷汇总


数据截至 2026 年 8 月 31 日 · 比率保留一位小数 · 情景数据

居民诉求办理及未办结诉求分布

未办结诉求 184 件，其中加装电梯进度慢 68 件、停车泊位不足 50 件，两类累计占比 64.1% 。

受理居民诉求	已办结	办结率	未办结
1286 件	1102 件	85.7%	184 件

办结率 = 已办结 ÷ 受理 ×100%

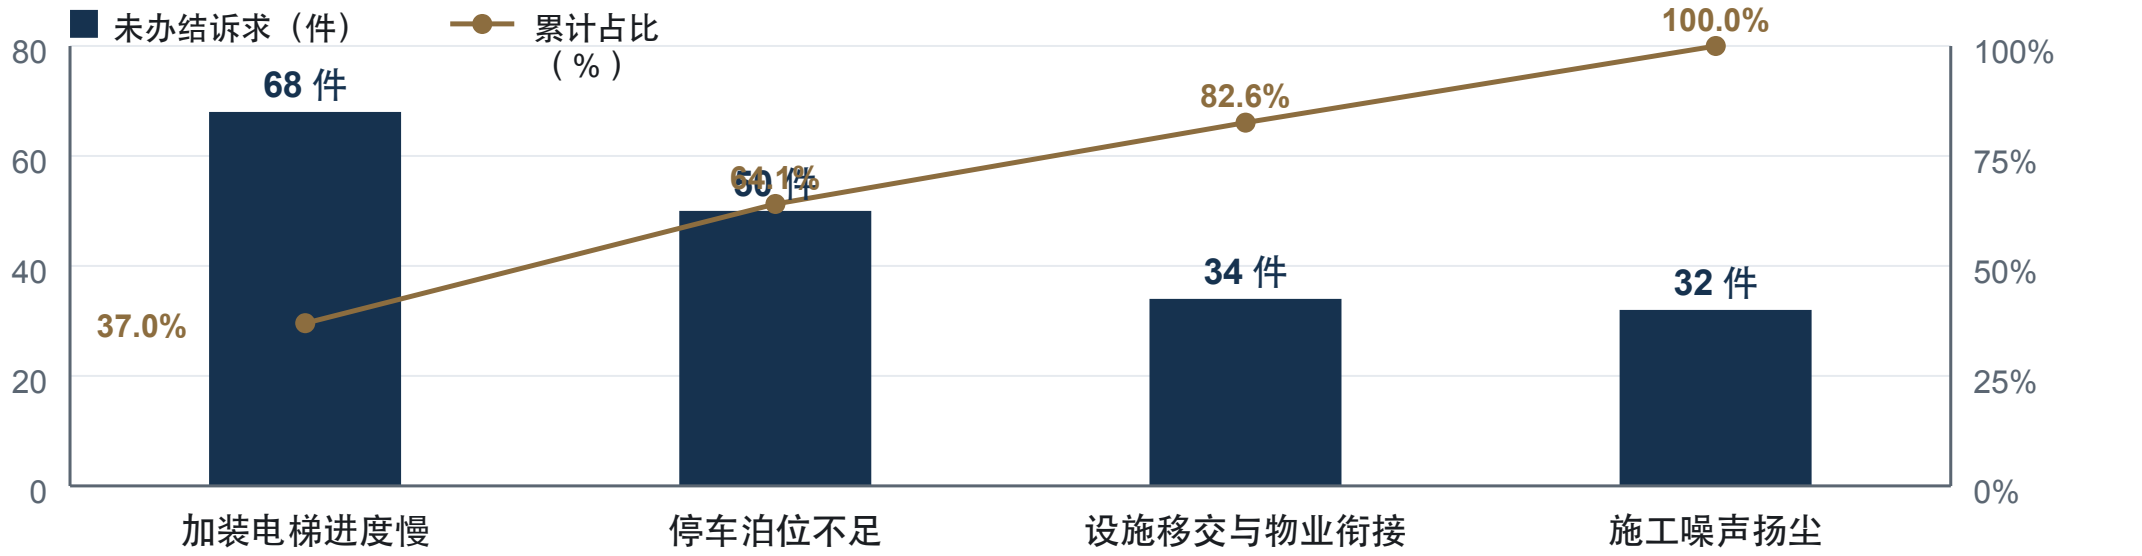

加装电梯进度慢与停车泊位不足两类合计 118 件、占未办结诉求 64.1% ，与 P08 中加装电梯 84.6% 、停车泊位及充电设施 82.1% 的低满意度互为印证，并对应 P04 中完成率 80.0% 、 89.4% 的两项滞后任务。

存在问题（一）：资金筹措与支出进度

两个资金类问题均由 P05 、 P06 数据直接导出：到位率 90.0% 与执行率 86.0% 的落差即为症结。

问题一　资金筹措渠道未闭合， 4280 万元缺口集中于三类渠道

数据溯源　P06 丨区级配套 81.8% （缺口 2140 万元）　P06 丨社会资本 73.0% （缺口 1140 万元）　P06 丨居民出资 65.8% （缺口 1000 万元）

主要表现

区级配套、社会资本、居民出资三类渠道到位率均低于 90.0% ，

三级财政资金已 100.0% 到位，缺口全部来自上述三类渠道。

影响

5 个在建小区尾款、 24 部电梯补贴暂无法

拨付，直接影响完工率与居民满意度。

问题二　支出进度滞后于资金到位， 5393 万元结余未形成实物工作量

数据溯源　P05 丨支出执行率 86.0% （低于到位率 90.0% ）　P06 丨提升类支出执行率 75.9% （结余 1579 万元）

主要表现

已到位 38520 万元中仅支出 33127 万元，账面积余 5393 万元，

其中 3236 万元因竣工结算审计未完成暂不能拨付。

影响

提升类支出执行率仅 75.9% ， 直接拖累社区服务

及养老托幼设施 79.2% 的完成率（见 P04 ）。

存在问题（二）：任务推进与居民诉求

三个实施类问题分别对应 P04 分项完成率、 P08 分项满意度与 P09 未办结诉求，逐项可回溯。

问题三 提升类与完善类任务推进不均衡

数据溯源 | P04 | 加装电梯 80.0%、停车泊位 89.4%　P04 | 服务设施 79.2%、智慧安防 89.7%　P08 | 电梯 84.6%、停车 82.1%

主要表现
四项滞后任务全部集中在完善类与提升类，基础设施类已完成。

影响
居民最关心的出行与养老需求未同步兑现。

问题四 施工期现场管理不到位，影响居民满意度

数据溯源 | P08 | 施工期现场管理满意度 79.4%，为七项最低　P09 | 施工噪声扬尘未办结 32 件

主要表现
围挡、降尘、噪声控制及文明施工公示在部分标段未落实。

影响
拉低总体满意度 93.8%，并引发投诉。

问题五 改造与后续管养衔接不畅

数据溯源 | P09 | 设施移交与物业衔接未办结 34 件，办结率 85.7%　P04 | 服务设施完成率 79.2%

主要表现
19 处社区服务及养老托幼设施建成后未及时移交运营。

影响
设施闲置风险上升，居民获得感打折扣。

问题来源： P04 分项任务完成明细、 P08 分项满意度、 P09 未办结诉求分布

数据截至 2026 年 8 月 31 日 · 比率保留一位小数 · 情景数据

整改措施与责任分工

七项措施逐条对应五项问题，明确责任单位、完成时限与验收口径，比率沿用 P02 统一阈值。

序号	对应问题	整改措施	责任单位	完成时限	验收口径
01	问题一	追加区级配套资金安排，将 2140 万元缺口纳入年度预算调整方案	区财政局、区住建局	2026 年 10 月底	区级到位率 **100.0%**
02	问题一	建立管线单位出资联席会议制度，签订“共建共担”协议并明确付费节点	区住建局、管线单位	2026 年 11 月底	社会资本到位率 **95.0%**
03	问题一	推行居民出资先改造后付费及分期缴纳，公示出资标准与使用去向	街道办事处、社区	2026 年 12 月底	居民出资到位率 **90.0%**
04	问题二	建立结余资金月调度机制，对 3236 万元待审计资金实行竣工结算限时办结	区财政局、审计局	2026 年 11 月底	支出执行率 **95.0%**
05	问题三	加装电梯与停车泊位项目单独建档、单独调度，实行一小区一方案	区住建局、规划分局	2026 年 11 月底	完成率均达 **90.0%**
06	问题四	落实文明施工标准，设置公示牌与噪声扬尘监测点，实行投诉 24 小时响应	区住建局、城管局	2026 年 10 月底	施工管理满意度 **90.0%**
07	问题五	明确设施移交清单与物业接管主体，同步签订后期管养协议	区住建局、民政局	2026 年 12 月底	设施移交率 **100.0%**

整改要求：上述七项措施自本报告审定之日起执行，每月 5 日前报送进展；验收口径中的比率均按 P02 统一口径计算。达标线 95.0% 、滞后线 90.0% ，与 P02 、 P08 判定阈值一致；责任单位为牵头单位，配合单位另行文明确。

措施依据： P10 、 P11 所列五项问题

数据截至 2026 年 8 月 31 日 · 比率保留一位小数 · 情景数据

长效机制与请示事项

以四项长效机制巩固改造成效，并就资金、工期与共建机制三项事项提请审议。

建立长效机制

1 资金保障长效化

将区级配套、管线单位及居民出资纳入年度预算与合同管理，实行到位率月通报。

2 支出进度闭环管理

建立结余资金台账与月度调度机制，竣工结算审计限时 30 个工作日办结。

3 居民全程参与机制

改造前问需、改造中问计、改造后问效，分项满意度低于 90.0% 的项目一律回头看。

4 改造与管养衔接

改造方案同步编制后期管养方案，明确物业接管主体与经费来源，设施建成即移交。

以上汇报，请予审议。

请示事项

一 追加区级配套资金

恳请区政府同意将 2140 万元区级配套缺口纳入年度预算调整方案，10 月底前拨付到位。

二 顺延在建项目工期

恳请同意 5 个在建小区完工时限顺延至 2026 年 11 月底，并按月报送进度。

三 支持管线单位共建共担

恳请将管线单位“共建共担”出资机制纳入市级文件，明确付费节点与比例。

以上请示事项，请予审议。
