非遗竹编工坊产业扶持项目申报评审汇报

省级非物质文化遗产竹编技艺 · “公司 + 合作社 + 农户”带动 120 户 · 总投资 280 万元

申报单位：××县××竹编工艺品有限公司／××竹编专业合作社

报送对象：县文化和旅游局、县乡村振兴办公室

申报要点： 280 万元扶持资金撬动 120 户增收

技艺传承
6 代 · 逾 150 年
现存 12 位师傅、平均 62 岁

认定层级
2018 年省级非遗
非遗保护＋产业带动双线


总投资
280 万元
公司＋合作社＋农户实施

带动农户
60 户→ 120 户
首年至第二年（＋ 100%，测算）

人均月增收
约 1800 元
在家编织、按件计酬

带动农户与月增收总额（第一、二年）

户为申报锁定值 · 万元为测算（户数 ×1800 元）

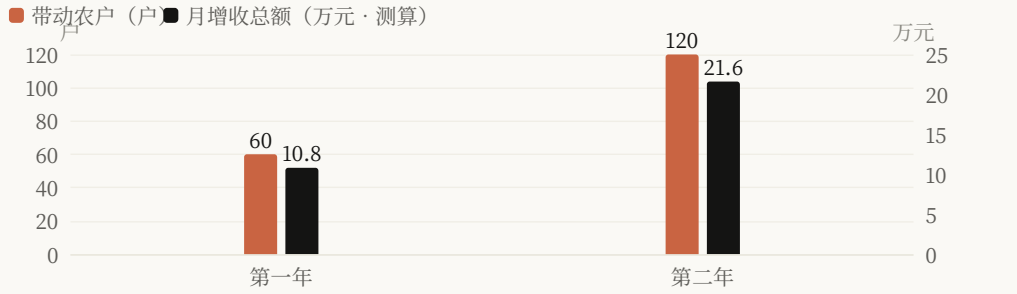

评审逻辑链条

六段承接 · 对应页码

- 技艺濒危 P3
- 省级非遗价值 P4
- 利益联结与带农增收 P5 、 P6
- 三年递进规划 P7
- 280 万元资金用途 P8
- 效益与风险防控 P9

申报请求

申请县级产业扶持资金 280 万元，分三年实施，资金用途与三年规划逐项对应，可核查、可考核。

第一年建成 800 ㎡工坊并培训 50 人｜第二年年产量扩至 10 万件｜第三年打造品牌、入驻电商平台

以下先说明为什么必须现在扶持 → P3

数据来源：本项目申报锁定口径；月增收总额 10.8 万元／ 21.6 万元、户均撬动约 2.33 万元为算术换算（测算）；第三年带动户数与年产量以申报材料为准。

技艺濒危： 12 位师傅平均 62 岁，传承窗口收窄

六代传承 · 逾 150 年

纵向时间轴按等距示意刻度排布：逾 150 年 ÷6 代≈每代约 25 年（测算，非史实年表）

- 第一代
  距今约 150 年前（等距示意）
- 第二代
  距今约 125 年前（等距示意）
- 第三代
  距今约 100 年前（等距示意）
- 第四代
  距今约 75 年前（等距示意）
- 第五代
  距今约 50 年前（等距示意）
- **第六代 · 当代（现存）**
  现存师傅 12 位、平均年龄 62 岁（给定口径）
  后继乏人，队伍冗余度接近于零

代际节点的姓名与年份以申报材料为准，缺失留空、不编造；一旦断代，工序失传、产品品质不可复制，省级非遗项目面临存续风险。

师傅队伍现状：规模极小，平均年龄处于传艺窗口后段


仅两条可比口径，不绘制年龄分布明细

6 代 · 逾 150 年
传承代数与年限（给定口径）

12 位
现存师傅人数（给定口径）

62 岁
师傅平均年龄（给定口径）

师傅平均年龄对比：本项目给定口径 vs 公开参照口径（单位：岁）



濒危信号：人数、年龄、徒弟三项可核查事实

人数少
现存师傅 12 位，单人退出即造成局部工序空心化（给定口径）

年龄高
平均 62 岁，已越过主要劳动年龄区间上沿（给定口径）

后继乏人
全国口径 55% 传承人无正式徒弟、 40 岁以下不足 8% （中国社会科学网， 2025 ，参照）

青年学艺意愿待提升
执法检查报告：传承人断代严重、年轻人学艺积极性不高（ 2024 ，参照）

时间窗口：以劳动年龄与退休制度的一般参照衡量，平均 62 岁已进入传艺窗口后段（定性参照，非本项目数据）。

机会成本：自然消亡不可逆，选竹、破篾、编织、定型等隐性经验无法复制。

这门技艺的分量，先看它的认定层级

数据来源：项目申报材料（给定口径：传承 6 代、逾 150 年、现存师傅 12 位、平均年龄 62 岁）；外部参照口径：中国非遗网（ 2018 ）、中国社会科学网（ 2025 ），均为参照、非本项目数据。

非遗分量： 2018 年获批省级，三重价值可核查

认定层级：国家—省—市—县四级名录

本项目处于第二级

国家级

国务院文化主管部门评审、国务院公布
1557 项、 3610 个子项，五批次（背景参照）

省级

省级认定程序：四环节闭环，文件与公示记录可核

01 材料审核与实地复核

02 专家评审（初评＋审议）

2018 年获批省级代表性项目（本项目）

省级文旅主管部门评审、省级人民政府公布

04 省级人民政府批准公布

技艺体系：四阶段工序链条

工序名称取公开可核查口径

选竹伐竹
选竹、锯竹、砍伐

→

刮青分篾分层
刮青、分层、破篾、分篾、拉丝

→

编织
编织、竹丝篾片成形

→

收口定型
收边、收口、打磨、烘干定型

公开口径为四川文旅厅 8 道、文旅中国 7 道工序；本项目实际工序名称与数量以申报材料为准，不虚构本地独有工序。

市级

市级文化主管部门评审、市级人民政府公布

三重价值：逐条对应政策接口

省级身份可直接进入县域文旅与工坊申报叙事

县级

文化认同价值	地方名片价值	产业转化价值
文化传承的集体记忆与身份认同，对应真实性、整体性、传承性	可纳入县域文旅叙事，参与非遗购物节、展示展销与电商平台推广	满足非遗工坊依托代表性项目的硬条件，提供品牌与品质背书

纳入省级认定为项目合规性与扶持必要性提供制度依据，对应非遗工坊遴选认定与县级乡村振兴项目库入库要求；认定层级说明它值得保，机制说明它如何带动农户。

本级直接申报受理

来源：《中华人民共和国非物质文化遗产法》、中国非物质文化遗产网／中国非物质文化遗产数字博物馆、湖北省与安徽省文化和旅游厅通知、广东省非遗申报指南、文旅部非遗工坊认定通知、四川文旅厅眉山竹编非遗技艺、文旅中国非遗工坊竹编培训；本项目 2018 年获批省级口径逐字沿用，名录编号、批次文号与代表性传承人姓名以申报材料为准，国家级项目数据仅作背景参照。

利益联结：三方分工到人，在家编织按件计酬



三方权责对照 承担职能 · 收益方式 · 承担风险（项目申报口径）

主体	承担职能	收益方式	承担风险
公司	产品设计与市场销售	设计与销售渠道收益（分配比例按公司章程约定）	市场与订单波动风险
合作社	统一采购原料并组织培训	组织服务收益（分配比例按合作社章程约定）	原料供应与质量、品控风险
农户	在家编织	按件计酬，人均月增收约 1800 元	不承担销售风险

按件计酬 5 步兑付 与统一供料、统一质检、统一销售对应

1 领料登记 → 2 在家编织 → 3 交验质检 → 4 计件核算 → 5 按月兑付

统一供料 · 统一质检 · 统一销售

人均月增收 **约 1800** 元 / 人 · 月

按件计酬结算，农户不承担销售风险；计件单价按品类与工序核定

低门槛就业
不出村、不误农，妇女与留守劳动力可参与

统一品控
合作社集中培训＋交验质检，计件与质量挂钩

风险分层
市场风险由公司承担，农户不承担销售风险


资料来源：项目申报口径（三方分工、在家编织按件计酬、人均月增收约 1800 元为锁定口径）；背景参照：封面新闻 2025 竹编、国家林草局雅安竹编、新华社 2025 非遗工坊。收益分配比例、计件单价与保底收购价以公司章程、合作协议及申报材料为准。

带农增收： 120 户人均月增收约 1800 元

首年 60 户、次年 120 户，人均月增收约 1800 元，测算月增收总额由 10.8 万元增至 21.6 万元。

带动农户数（户）

第二年为第一年 2 倍 · +60 户 · +100%（测算）

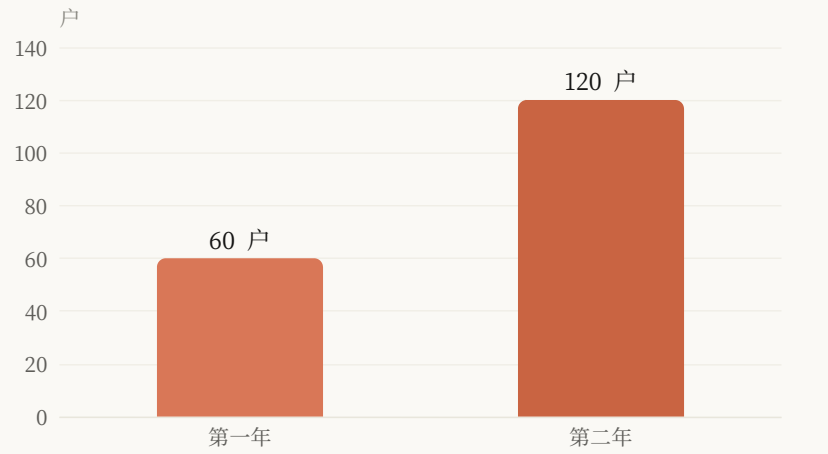

人均月增收 · 申报口径给定值

约 1800 元／人 · 月

按件计酬、按月兑付，实际以质检合格件数结算

增收测算表 年值按稳定接单 12 个月折算

口径	首年（60 户）	第二年（120 户）
人均月增收	约 1800 元 / 人 · 月	约 1800 元 / 人 · 月
月增收总额（测算）	10.8 万元 / 月（60×1800）	21.6 万元 / 月（120×1800）
年增收总额（测算）	129.6 万元 / 年	259.2 万元 / 年

敏感性口径：稳定接单 10 个月时为首年 108 万元、第二年 216 万元（测算），不作为既成实绩。

测算假设与考核

户均 1 人参与编织、满勤计件、单价稳定、订单持续；按季度考核，凭证为计件结算单与按月兑付记录。

优先吸纳与培训（规划口径）

优先吸纳留守妇女、中老年劳动力、脱贫人口与监测对象；第一年培训 50 人服务首年 60 户，缺口由合作社分批轮训补足。

背景对标（口径不同，不混算）

全国 1.1 万余家非遗工坊带动相关产业链 120 余万人就业增收（新华社 2025）；典型工坊人均月增收 1500—2200 余元。

数据来源：申报口径给定值（60 户、 120 户、约 1800 元 / 人 · 月、第一年培训 50 人）；月 / 年增收总额与增幅均为算术测算值，第三年带动口径以申报材料为准、不外推。

三年规划：建阵地、扩产能、树品牌逐级递进

三年三级台阶：第一年建成 800 ㎡工坊并培训 50 人，第二年产能扩至年产量 10 万件、计件农户 120 户，第三年打造品牌、入驻电商平台。

1 第一年 建阵地

800 ㎡
工坊建筑面积

50 人
累计培训人数

支撑动作
工坊建设、设备进场，合作社集中培训与师傅带徒

前置依赖
省级非遗技艺、 12 位师傅与首期 60 户基础

2 第二年 扩产能

10 万件 / 年
年产量达产口径

120 户
计件农户数

支撑动作
原料统一采购扩量、计件农户由 60 户扩至 120 户、质检与工序标准化

前置依赖
第一年 800 ㎡工坊投用＋ 50 人培训完成

计件农户与年产量 10 万件为规划匹配关系，不作单产承诺

3 第三年 树品牌拓渠道

自有品牌
品牌打造

电商平台入驻
外销渠道拓展

支撑动作
产品设计与品牌包装、电商店铺开设与运营、参加展示展销与非遗购物节

前置依赖
第二年年产量 10 万件的稳定供货能力

政策通道
文旅部持续推动非遗工坊建设，支持通过非遗购物节、电商平台拓展销售渠道

销售额与店铺数量目标由年度经营计划细化，本阶段不作承诺

里程碑与考核节点 只写年度节点，不写开工月份与具体日期

第一年末 工坊建成投用 · 培训台账与考核记录
考核： 800 ㎡建成投用、培训 50 人完成
责任：公司（建设、设备）＋合作社（培训、师傅带徒）

第二年末 产能达产记录 · 计件结算与质检台账
考核：年产量 10 万件、计件农户 120 户
责任：合作社（采购、质检）＋公司（排产、销售）

第三年末 品牌物料 · 电商平台店铺开设证明
考核：品牌形成并入驻电商平台
责任：公司（品牌、电商运营）

三年贯穿 专账核算、按进度拨付、验收后结算
考核：人均月增收约 1800 元、总投资 280 万元按科目执行
责任：公司＋县级主管部门监督，年度绩效报告

时间轴贯穿三年：后一阶段以前一阶段产出为前提，工坊与技能人才 → 产能 → 品牌与渠道，逐级递进、不可倒置。

建阵地 · 第一年
形成生产场地与技能人才，支撑后两级台阶
无工坊则集中培训与标准化生产无处落地
科目：厂房 120 万 · 设备 60 万（进场） · 培训 30 万

→

扩产能 · 第二年
形成年产量 10 万件的稳定供货能力
无产能与稳定供货则品牌与电商渠道无法维持
科目：设备 60 万（扩产） · 培训 30 万 · 流动 30 万

→

树品牌拓渠道 · 第三年
形成外销出口与自我造血能力
无品牌与渠道则产能只能依赖本地零星订单
科目：品牌推广 40 万 · 流动资金 30 万（滚动）


资料来源：项目申报锁定口径（ 800 ㎡、培训 50 人、年产量 10 万件、计件农户 120 户、第三年品牌与电商平台入驻）；三年合计总投资 280 万元，阶段资金科目的逐项对应见次页。

资金用途： 280 万元五项构成，合计校验一致

总投资 280 万元＝厂房建设 120 ＋设备采购 60 ＋培训经费 30 ＋品牌推广 40 ＋流动资金 30 万元，五项合计校验一致，并逐项对应三年规划产出。

资金构成占比（5 项）

单位：万元 · 占比为测算



120+60+30+40+30＝280 万元（合计一致）

占比为测算值，保留一位小数并四舍五入，合计 100.0%

资金—规划逐项对应表

阵地 → 产能 → 能力 → 市场 → 周转

资金项	金额	对应阶段	形成的实物／能力产出
厂房建设	120 万元	第一年	建成 1 处标准化生产车间，形成年产 [illegible] 能力
设备采购	60 万元	第一年	购置 [illegible] 台（套）生产设备，满足首批订单交付
培训经费	30 万元	第一至第二年	完成 [illegible] 人次技能培训，形成稳定操作团队
品牌推广	40 万元	第一至第三年	开拓 [illegible] 个销售渠道，建立品牌认知
流动资金	30 万元	第一年	保障原材料采购与周转，支撑首年滚动经营

资金管理与合规　专账核算　按进度拨付　验收后结算　留存凭证

符合县级扶持资金与乡村振兴项目库管理要求（文旅部 工坊认定通知）；分渠道列支、科目不混用，配套结构按县级主管部门核定执行。

数据来源：申报口径给定值（总投资 280 万元；厂房 120 ／设备 60 ／培训 30 ／品牌 40 ／流动资金 30 万元）；占比为金额 ÷280 万元的算术测算值，四舍五入保留一位小数后合计 100.0%；合规口径参照文旅部工坊认定通知与县级衔接资金管理要求。

效益保障：投入产出可考核，四类风险有防控

280 万元形成 800 ㎡工坊、年产量 10 万件产能，带动计件农户 60 户→ 120 户、人均月增收约 1800 元；四类风险均有防控措施与责任主体，四类保障机制同步落地。

投入产出对应关系图

与资金用途五项构成逐项对应

投入（资金项）

对应阶段

形成的产出／考核指标

厂房建设
80 万元

合计 280 万元 · 贯穿性产出

人均月增收约 1800 元（三年贯穿）； 12 位师傅技艺有人接续

第一年

文化传承效益可持续影响 + 社会效益

800 ㎡工坊建成投用

对象： 12 位师傅（平均 62 岁）与省级非遗竹编技艺

设备采购
60 万元

措施：师带徒与培训 50 人，技艺记录与工序标准化

载体：800 ㎡工坊投用，工序与产品标准留存

凭证：培训台账、师带徒协议、技艺记录与标准文本

农户增收效益社会效益

对象：计件农户首年 60 户 → 第二年 120 户

指标：人均月增收约 1800 元，三年贯穿

测算：月增收总额 10.8 万元 → 21.6 万元（户均 1 人计件）

第一年进场
第二年扩产

验证：计件结算表、按月兑付凭证、带动农户名册

四类风险防控表

责任主体由公司、合作社、农户既定分工推导

支撑年产量 10 万件的原料处理、编织辅助与烘干定型能力

风险类别
风险表现
防控措施
责任主体

培训经费
30 万元

组织保障　县级主管部门指导，公司管设计与销售、合作社管原料采购与培训、农户在家编织按件计酬

制度保障　按件计酬结算制度、交验质检制度、专账核算与凭证留存制度，载体为计件结算表与质检记录

监督保障　按进度拨付、验收后结算、结算公示、年度验收与绩效报告，台账备查并接受县级主管部门监督

持续保障　第三年品牌打造与电商平台入驻形成外销出口与自我造血能力，降低对扶持资金的依赖

第一年为主
延续第二年

技艺断代风险

12 位师傅平均 62 岁，“后继之人则工序与产品标准失传

师带徒与培训 50 人；技艺记录与工序标准化；培训经费 30 万元专款用于培训与记录

培训 50 人，支撑计件农户由 60 户扩至 120 户

合作社 + 师傅

市场与订单风险

品牌推广
40 万元

公司

公司统一接单与销售；第三年入驻电商平台拓展渠道；按订单排产、以销定产

第三年

原料与品控风险

竹材供应量与质量不稳，影响交付与计件单价核算

品牌与电商平台入驻后交付

合作社统一采购竹材；进厂交验质检并与计件结算挂钩；工序标准化统一品控口径

数据来源：项目申报测算表（总投资 280 万元，新建工坊 800 ㎡、培训 50 人、年产量 10 万件、 60 户→ 120 户、人均月增收约 1800 元）； 月增收总额为算术测算值，绩效分栏参照财政项目支出绩效评价通用框架。

汇报结束

恳请评审指导，感谢聆听

恳请县文化和旅游局、县乡村振兴办公室评审领导与专家指导；本报告数据均可提供原始凭证与台账备查。

申报单位：××县××竹编工艺品有限公司／××竹编专业合作社

汇报日期：按评审日期填写 · 联系人与联系电话、地址：按申报材料填写
